


Дата: 30.11.2016

EKOMEDIS Klaipėda

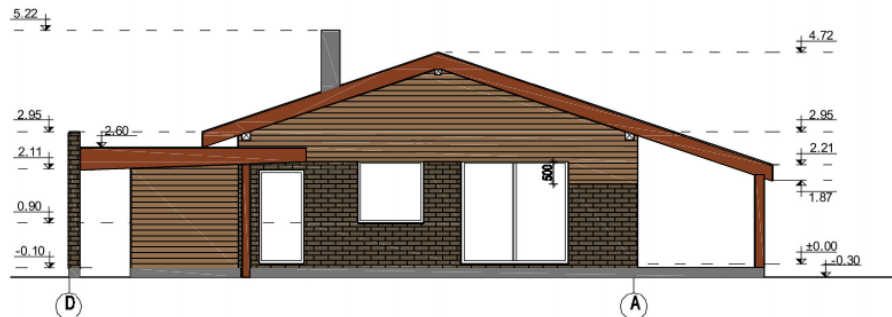

Gerb.,

Pasiūlymas:

Prašau, peržiūrėkite mūsų detalią namo sąmatą. Sienų storius, bei medžiagas galima keisti pagal Jūsų pageidavimus.

Projektas: Tomas
Nr: 102

Поз.	Описание	Количе ство	Един ица	Цена за ед.	ОбщЦена
1.	Stogo darbai su medžiagomis				
1.1	Stogo danga skarda; Grebėstai 45x45; Ventilacinis tašelis 45x20; Difuzinė plėvelė; Mediena stogui (sausas, kalibruotas) C24 klasė stogo konstrukcija arba santvaros; Mineralinė vata 300mm ($\lambda_D = 0,035$ W/mK) Pol. Plėvelė stab. 200mk/3; Instaliacinis tašelis 45 x45mm; Mineralinė vata 50mm ($\lambda_D = 0,035$ W/mK) komplektuojama	187.20	m ³	95.00	17784.00 €
2.	Sienų konstrukcijos				
2.1	Skydinių sienų pagaminimas ir montavimas (Lauko apdaila - medinės daililentės; Ventilacinis tašelis - 20mm; Lauko plokštė 9 mm, Karkasas 195/ termoizoliacija 200 mm ($\lambda_D = 0,035$ W/mK), garo plėvelė 200mikronų, Instaliacinis tašelis 45 mm; apšiltinimas 50mm ($\lambda_D = 0,035$ W/mK) komplektuojama	120.00	m ²	90.00	10800.00 €
2.2	Vidinių sienų pagaminimas ir montavimas (karkasas 95/145mm, apšiltinimas 100mm (KNAUF $\lambda_D = 0,035$ W/mK))	130.00	m ²	25.00	3250.00 €
2.3	Preliminari kaina plastikinių langų dviejų/ trijų stiklo paketų.	0.00		0.00	0.00 €
3.	Perdanga				
	(Durelis plokštė 22mm, Karkasas 45x195/240	0.00		62.00	0.00 €

Поз.	Описание	Количе ство	Един ица	Цена за ед.	ОбщЦена
	termoizoliacija 200 mm($\lambda D= 0,035 \text{ W/mK}$) , Instaliacinis tašelis 45x45 mm				
4.	Transporto paslaugos				
	Kranas, transportavimas,surinkimas	130.00		42.00	5460.00 €

Сумма Нетто	37294.00 €
НАЛ 21.00 %:	7831.74 €
Общая сумма:	45125.74 €

Pagarbiai,
Aleksej Fedosejev
8-611-89918
www.ekomedis.lt
